

高台县城关全民健身中心 建设项目绩效评价报告

项目名称：高台县城关全民健身中心建设项目

主管部门：高台县体育运动中心

评价类型：事前评价☐ 事中评价☐ 事后评价 ☒

评价方式：部门（单位）绩效自评☐ 财政部门组织评价 ☒

评价机构：甘肃正邦力生会计师事务所（普通合伙）



报告摘要

受高台县财政局委托，甘肃正邦力生会计师事务所对高台县城关全民健身中心建设项目开展了绩效评价。

2023年7月3日至8月30日甘肃正邦力生会计师事务所成立了由注册会计师、一级造价师、投资咨询师肖广萍任组长的高台县城关全民健身中心建设项目绩效评价组，通过调阅自评报告，研究案卷、查阅工程前期建设和财务资料、现场踏勘和座谈交流等方式，对各项绩效指标进行了分析评价。

评价报告从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个方面进行了绩效评价，客观公正地提出了评价结论和绩效分析，实事求是地指出了存在的问题并针对性地提出了相关建议。

一、项目基本情况

"十三五"时期，是协调推进"四个全面"战略布局、实现中华民族伟大复兴中国梦的重要时期，也是落实全民健身国家战略、加快体育事业和体育产业发展的重要战略机遇期。为更好发挥体育在建设健康高台、增强人民体质、保障改善民生、促进经济发展和全面建成小康社会等方面的重要作用，高台县社会体育运动中心在高台县委、县政府的大力支持下，拟在高台县城关镇新建全民健身中心一座。

根据甘肃省财政厅下发《关于下达2019年公共体育普及工程中央基建投资预算的通知》（甘财经一〔2019〕50号），对张掖市高台县城关全民健身中心2019年中央基建预算指标480万元，专项用于该项目建设，2022年8月2日，《关于高台县2022年第二批地方政府债券安排计划和全县财政预算调整方案的报告》为高台县城关全民中心建设项目拨款500万，专项用于该项目建设，统筹建设全民健身场地设施，方便群众就近就便健身。

根据高台县发展和改革委员会《关于高台县城关镇全民健身中心可行性研究报告的批复》（高发改〔2018〕162号）高台县体育运动中心拟建高台县城关镇全民健身中心的土建工程，及室外配套工程，总建筑面积3198.27平方米，地上一层（局部二层），框架结构，内

设篮球场 2 个、排球场 1 个、羽毛球场 2 个、室内健身房、器材室、更衣室等，并配套完成附属设施。

二、评价结论

根据评价指标体系分析评定，高台县城关全民健身中心建设项目绩效评价综合得分 84.1 分，绩效评价等级为“良”。结果显示：该项目在效益方面基本达到预期效果，在过程、产出方面存在一定差距，相比而言决策和效益指标较好，表明项目的实施对社会产生了的积极影响。

目录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
1. 项目背景	1
2. 项目主要内容	2
3. 高台项目实施情况	2
4. 项目资金投入及使用情况	6
二、绩效评价工作开展情况	8
(一) 评价目的	8
(二) 评价对象	8
(三) 评价依据	8
(四) 评价原则、评价方法	8
1. 评价原则	9
2. 主要评价方法	9
(五) 绩效评价指标体系、评价标准等级	10
1. 绩效评价指标体系	10
2. 评价标准及评价等级	10
(六) 绩效评价工作过程	10
1. 前期准备阶段	10
2. 组织实施	11
3. 分析评价	11
4. 撰写报告	11
三、综合评价情况及评价结论	11
四、绩效评价指标分析	12
(一) 项目决策情况（分值 16 分，得分 13 分）	12
1. 项目立项（分值 6 分，得分 6 分）	13
2. 绩效目标（分值 4 分，得分 4 分）	14
3. 资金投入（分值 6 分，得分 3 分）	15
(二) 项目过程情况（分值 19 分，得分 16.1 分）	16

1.资金管理（分值 11 分，得分 10.1 分）	16
2.组织实施（分值 8 分，得分 6 分）	17
（三）项目产出情况（分值 35 分，得分 25 分）	18
1.产出数量（分值 12 分，得分 12 分）	19
2.产出质量（分值 13 分，得分 13 分）	19
3.产出时效（分值 6 分，得分 0 分）	20
4.产出成本（分值 4 分，得分 0 分）	20
（四）项目效益情况（分值 30 分，得分 30 分）	20
1.经济效益（分值 2 分，得分 2 分）	21
2.社会效益（分值 8 分，得分 8 分）	21
3.生态效益（分值 3 分，得分 3 分）	21
4.可持续性影响（分值 8 分，得分 8 分）	21
5.满意度（分值 9 分，得分 9 分）	22
五、主要经验及做法	22
制定了基建工程项目建设管理办法	22
六、存在的问题	22
七、有关建议	22

甘肃正邦力生会计师事务所

GANSU ZHENGBO LISHENG C.P.A PARTNERSHIP.

甘正力绩评字〔2023〕第 034 号

高台县城关全民健身中心

建设项目绩效评价报告

为加强财政预算资金管理，提高财政资金使用效益，根据中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、中共甘肃省委甘肃省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、甘肃省财政厅关于印发《甘肃省省级预算绩效管理办法等6个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）、中共张掖市委张掖市人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（市委发〔2019〕19号）等文件精神，甘肃正邦力生会计师事务所受高台县财政局委托，对高台县体育运动中心实施的高台县城关全民健身中心建设项目进行了绩效评价工作，现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

2016年6月23日，国务院印发《全民健身计划（2016—2020年）》明确指出全民健康是国家综合实力的重要体现，是经济社会发展进步的重要标志。全民健身是实现全民健康的重要途径和手段，是全体人民增强体魄、增加幸福生活的基础保障。实施全民健身计划是国家的重要发展战略。有效扩大增量资源，重点建设一批便民利民的中小型体育场馆，建设县级体育场、全民健身中心、社区多功能运动场等场地设施，结合基层综合性文化服务中心、农村社区综合服务设施建设及区域特点，继续实施体育健身工程，实现健身设施全覆盖。

为更好发挥体育在建设健康高台、增强人民体质、保障改善民生、

促进经济发展和全面建成小康社会等方面的重要作用，高台县社会体育运动中心在高台县委、县政府的大力支持下，拟在高台县城关镇新建全民健身中心一座，项目总建筑面积 3198.27 平方米，总占地面积 2917.72 平方米。

2019 年 4 月 8 日甘肃省财政厅下发《关于下达 2019 年公共体育普及工程中央基建投资预算的通知》（甘财经一〔2019〕50 号），对张掖市高台县城关全民健身中心 2019 年中央基建预算指标 480 万元，专项用于该项目建设，2022 年 8 月 2 日，《关于高台县 2022 年第二批地方政府债券安排计划和全县财政预算调整方案的报告》为高台县城关全民健身中心建设项目拨款 500 万，专项用于项目建设。

2. 项目主要内容

根据高台县发展和改革委员会《关于高台县城关镇全民健身中心可行性研究报告的批复》（高改发〔2018〕162 号）、高台县发展和改革委员会《关于高台县城关全民健身中心建设项目初步设计的批复》（高改发〔2019〕146 号）、《关于高台县城关全民健身中心建设项目配套设施及变更部分建设内容初步设计的批复》（高改发〔2019〕147 号），该项目建设规模和主要内容为高台县城关镇全民健身中心的土建工程及室外配套工程，总建筑面积 3198.27 平方米，框架结构，主体一层，局部两层，建筑总高度为 15.15 米，一层层高 6 米，二层层高 9 米，长度为 78.8 米，宽度为 36.8 米，内设篮球场 2 个、排球场 1 个、羽毛球场 2 个、室内健身房、器材室、更衣室等，建筑物耐火等级为二级，抗震设防烈度为 8 度，工程抗震设防分类为重点设防类（乙类），并对外保温、幕墙、门窗、内外墙粉刷、楼地面材料、顶棚、扶手、脚踢等部位进行装饰装修，并配套完成附属设施。

3. 高台项目实施情况

（1）项目组织管理

①项目法人制

根据 2018 年 9 月 14 日高台县发展和改革委员会《关于高台县城关镇全民健身中心可行性研究报告的批复》（高改发〔2018〕162 号），该项目实施单位为高台县体育运动中心。高台县体育运动中心成立于

2006 年，属于全额拨款事业单位，统一社会信用代码 12622225739618925N，法定代表人赵文凯，开办资金 59 万元，举办单位为高台县文体广电和旅游局，住所为高台县城关镇解放北路 287 号，宗旨和业务范围为负责全县体育宣传、体育执法、体育事业发展等工作，全民提高国民体质。

②项目领导小组

为高效推进城关全民健身中心项目建设，2020 年 3 月 16 日，经高台县文体广电和旅游局、高台县教育局研究决定，成立高台县城关全民健身中心项目建设推进领导小组，并发文《成立高台县城关全民健身中心项目建设推进领导小组的通知》，任县文体广电和旅游局局长为组长，县教育局副局长、县文体广电和旅游局副局长、县职业中等专业学校校长为副组长，县职业中等专业学校副校长、县社会体育运动中心副主任、县职教中专总务主任、甘肃时泰建筑工程有限公司项目负责人、甘肃荣兴工程管理咨询有限公司监理、县文体广电和旅游局财务室负责人、县社会体育运动中心工作人员、县社会体育运动中心财务人员为成员的工作领导小组；同时在县文体广电和旅游局设立领导小组办公室，由县文体广电和旅游局副局长兼任办公室主任，县社会体育运动中心副主任、县职教中专总务主任任办公室副主任，具体负责协调项目建设日常事务。

（2）项目管理

项目实施单位适用现代企业管理模式，非传统的行政体制，采用市场化运作机制，劳动人事制度、激励和约束机制的建立按照市场经济要求进行，确保企业健康有序的发展。

项目组织体系采用项目经理负责制，以项目组为核心、协调下的各部门为支撑。项目经理的主要任务是自始至终全面负责项目的实施，包括组织项目组成员和利用外部人力资源进行《项目任务计划书》的编制、工程进度控制、预算控制、法律与行政障碍的排除等。为确保项目管理的有效实施，项目主管单位多次咨询专业咨询机构为项目提供专业的设计方案和施工图纸等，以《高台县社体中心基建工程项目建设管理办法》为依据推进项目。

（3）项目立项

①2018年8月，高台县体育运动中心向高台县发展和改革委员会上报《关于高台县城关全民健身中心可行性研究报告》，根据甘肃厚源工程设计有限公司《关于上报〈高台县城关全民健身中心可行性研究报告咨询评估意见〉的报告》（甘厚源评审〔2018〕35号），2018年9月14日，高台县发展和改革委员会下达《关于高台县城关镇全民健身中心可行性研究报告的批复》（高发改〔2018〕162号），同意该可行性研究报告。

②2019年5月，高台县体育运动中心向高台县发展和改革委员会上报《关于高台县城关全民健身中心建设项目初步设计》和《关于高台县城关全民健身中心建设项目配套设施及变更部分建设内容初步设计的报告》，根据甘肃厚源工程设计有限公司《高台县城关全民健身中心建设项目初步设计审查意见》（甘厚源评审〔2019〕14号）和《高台县城关全民健身中心配套设施及变更部分建设内容初步设计审查意见》（甘厚源评审〔2019〕26号），2019年10月11日，高台县发展和改革委员会下达《关于高台县城关全民健身中心建设项目初步设计的批复》（高发改〔2019〕146号）和《关于高台县城关全民健身中心建设项目配套设施及变更部分建设内容初步设计的批复》（高发改〔2019〕147号），同意该项目初步设计。

（4）项目招标

2019年7月11日，高台县社会体育运动中心与甘肃华诚博远工程管理有限公司签订了《建设工程招标代理合同》，高台县社会体育运动中心委托甘肃华诚博远工程管理有限公司为高台县城关全民健身中心建设项目承担招标代理工作。

甘肃华诚博远工程管理有限公司于2019年12月4日在张掖市公共资源交易中心网站发布了公开招标公告，并于2019年7月16日发布了更正公告，以上招标公告主要建设内容：总建筑面积3198.27平方米，地上一层（局部二层），框架结构，内设篮球场2个、排球场1个、羽毛球场2个、室内健身房、器材室、更衣室等，并配套完成附属设施。经评标委员会评审，投标函附录中项目名称与投标文件不

符，有效投标单位不足 3 家，予以废标；2019 年 12 月 4 日发布二次招标，截止 2019 年 12 月 9 日 17 时，共有 16 家公司参与报名，15 家公司递交了纸质报告，经过资格预审，共有 9 家公司参与竞标，分别为甘肃时泰建筑工程有限公司、甘肃福泰建筑工程有限公司、甘肃运启建筑安装工程有限责任公司、高台县众诚建筑工程有限公司、甘肃昇宝建筑安装有限责任公司、高台县泓宇建筑工程有限公司、甘肃宇阳建筑工程有限公司、甘肃高台宣化纪兴建筑有限责任公司、甘肃高台恒源建筑安装有限责任公司。2019 年 12 月 23 日经评标委员会评审，确定 3 家中标候选人，分别为甘肃时泰建筑工程有限公司、甘肃福泰建筑工程有限公司、甘肃高台宣化纪兴建筑有限责任公司，中标单位为甘肃时泰建筑工程有限公司，中标金额为 7,935,855.65 元，2019 年 12 月 27 日，对招标结果进行了公示，2019 年 12 月 30 日，对投标单位发布了中标通知书。

（5）项目建设过程

高台县社会体育运动中心通过公开招标，确定甘肃时泰建筑工程有限公司为项目实施方，项目开工日期为 2020 年 3 月 25 日，2020 年 9 月项目施工至主体框架完工后停工，完工部分约 510 万元。停工原因为施工单位核对工程量清单后提出招标的工程量清单漏算少算项较多需大量增加工程价款。2022 年 8 月 25 日高台县文体广电和旅游局《关于高台县城关全民健身中心建设项目资金支付的批复》（高文体广旅发〔2022〕101 号）同意划拨 300 万元国债建设资金，用于支付项目建设资金，该项目得以复工，截止 2023 年 9 月工程基础及主体工程已全部完工。

（6）项目完成情况

截止 2023 年 10 月 20 日，全民健身中心建设项目已完成工程验收，完成建筑面积 3198.27 平方米，地上一层，局部两层，框架结构。建筑总高度为 15.15 米，一层层高 6 米，二层层高 9 米，长度为 78.8 米，宽度为 36.8，内设篮球场地 2 块、羽毛球场地 2 块、排球场地 1 块、健身场馆 1 处、乒乓球场馆 1 处。建筑物耐火等级为二级，抗震

设防烈度为 8 度，工程抗震设防分类为重点设防类（乙类），并对外保温、幕墙、门窗、内外墙粉刷、楼地面材料、顶棚、扶手、脚踢等部位进行装饰装修，完成附属设施停车位 20 辆、室外绿化带。

4. 项目资金投入及使用情况

（1）资金来源

①2019 年 4 月 8 日，甘肃省财政厅通过《关于下达 2019 年公共体育普及工程中央基建投资预算的通知》（甘财经一〔2019〕50 号）下达 2019 年中央基建预算资金 480 万元，专项用于项目建设。

②2022 年 8 月 2 日，高台县人民代表大会常务委员会通过《关于全县财政预算调整方案的决议》（人大常发〔2022〕15 号）批准一般债券资金 500 万元，用于项目建设。

（2）资金到位情况

根据批复的 2019 年度中央基建投资预算，高台县城关全民健身中心 2019 年的预算金额为 480 万元；根据 2022 年高台县财政预算调整方案的决议，向高台县城关全民健身中心安排一般债券资金 500 万元。

（3）资金使用情况

截止评价日，高台县城关全民健身中心建设项目累计支付 8,800,000.00 元，其中支付工程款 8,375,247.00 元,支付其他费用 424,753 元。具体明细如下：

日期	企业	费用类别	金额（元）
2019 年 6 月 14 日	甘肃北斗天地测绘有限公司	测绘费用	3,000
2019 年 7 月 5 日	甘肃省建筑设计研究院有限公司	审阅费	4,700
2020 年 1 月 6 日	甘肃厚源工程设计有限公司	可行性研究评估费	10,000
2020 年 1 月 6 日	甘肃厚源工程设计有限公司	初步设计审查评估费	15,000

2020 年 1 月 6 日	甘肃厚源工程设计有限公司	初步设计更改评估费	15,000
2020 年 1 月 7 日	兰州华文工程技术咨询有限公司	可行性研究编制费	30,000
2020 年 1 月 10 日	华睿城项目管理有限公司	造价咨询服务费	37,100
2020 年 1 月 10 日	甘肃华诚博远工程管理有限公司	招标代理费	54,100
2020 年 1 月 31 日	甘肃时泰建筑工程有限公司	工程款	2,000,000
2020 年 3 月 12 日	张掖市建筑勘察设计院	设计费用	112,000
2020 年 5 月 31 日	甘肃时泰建筑工程有限公司	工程款	2,000,000
2020 年 9 月 23 日	甘肃荣兴工程管理咨询有限公司	监理费用	100,000
2020 年 9 月 30 日	甘肃时泰建筑工程有限公司	工程款	300,000
2020 年 10 月 10 日	甘肃鸿宇建设咨询有限公司	预算编制费用	37,853
2020 年 12 月 31 日	甘肃中冶岩土工程有限公司	地勘费用	6,000
2020 年 12 月 31 日	甘肃时泰建筑工程有限公司	工程款	75,247
2022 年 5 月 31 日	甘肃时泰建筑工程有限公司	工程款	3,000,000
2022 年 12 月 31 日	甘肃时泰建筑工程有限公司	工程款	1,000,000
合计			8,800,000

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

通过对高台县城关全民健身中心建设项目绩效评价，全面了解项目的立项、项目管理和实施情况、项目资金使用情况、项目完成情况；展示项目实施取得的成绩，总结项目实施经验和亮点，发现项目实施存在的问题，并针对存在的问题提出切实可行的意见；促使项目承担单位加强预算绩效管理，提高项目管理水平，保证项目资金使用规范、安全、有效；为实现资源优化配置和提高财政资金使用效益提供参考意见。

（二）评价对象

本次绩效评价的对象为高台县城关全民健身中心建设项目及其预算资金。

（三）评价依据

- 1、《中华人民共和国预算法》；
- 2、《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令第 729 号）；
- 3、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
- 4、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）；
- 5、财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知(财预〔2013〕53 号)；
- 6、中共甘肃省委甘肃省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32 号）；
- 7、甘肃省财政厅关于印发《甘肃省省级预算绩效管理办法》等 6 个办法和规程的通知（甘财绩〔2020〕5 号）；
- 8、《中华人民共和国招标投标法》；
- 9、中国注册会计师协会《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》（会协〔2016〕10 号）；
- 10、绩效评价过程中获取的自评报告、其他文件及凭证等资料。

（四）评价原则、评价方法

1.评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价将严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价将本着符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价将针对项目具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的紧密对应关系。

（4）激励约束原则。绩效评价将评价结果与项目的设立、整合、调整等挂钩，作为完善政策、改进管理、安排预算的重要依据。

（5）重点核查原则。对于项目难点、热点问题，以及对支出数额大的、效益明显的项目，进行重点核查。

2.主要评价方法

根据财政部《财政支出绩效评价管理办法》的规定，财政和部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（7）其他评价方法。

（五）绩效评价指标体系、评价标准等级

1. 绩效评价指标体系

根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）、甘肃省财政厅关于印发《甘肃省省级预算绩效管理办法》等6个办法和规程的通知（甘财绩〔2020〕5号）的相关要求，针对项目情况，制订绩效评价指标体系，从决策、过程、产出及效益四大方面拟定绩效评价指标，其中一级指标4个，二级指标10个，三级指标25个，指标权重自上而下按指标层次分步确定。该项目制定的指标体系如下表：

2. 评价标准及评价等级

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。满分为100分，评价等级分为优、良、中、差。

绩效评价结果级次表

评价档次	优	良	中	差
评价分值	90（含）-100分	80（含）-90分	60（含）-80分	60分以下

（六）绩效评价工作过程

1. 前期准备阶段

（1）2023年7月31日，成立高台县城关全民健身中心建设项目绩效评价工作小组，负责绩效评价工作的组织协调、管理工作和具体绩效评价工作。

（2）2023年8月1日，制定高台县城关全民健身中心建设项目绩效评价工作方案。

（3）2023年8月2日，执行高台县城关全民健身中心建设项目绩效评价工作方案，编制绩效评价指标体系。按照公平公正的绩效评价原则，合理制定切实可行，操作性强的实施方案，并在收集资料、充分调研的基础上编制评价指标体系。

（4）2023年8月5日，评价方案和指标体系形成初稿后，通过项目绩效评价工作小组内部评审，根据组长意见，修改绩效评价方案和指标体系。

2. 组织实施

(1) 资料检查阶段。绩效评价小组到项目实施单位实地现场收集相关项目资料，收集、查阅项目实施单位的基本概况、管理措施，查阅项目预算申请文件、资金下达文件、项目实施进度、重点决策会议记录、财务收支计划、查阅绩效目标完成情况自评报告等的资料、文件及相关制度等，在核查过程中，收集足够的相关信息，掌握详细资料，准备好各类基础资料。

(2) 现场调查。通过向项目实施单位及其他利益相关者发放调查问卷，了解实施过程中存在的问题以及项目实施单位的需求，为项目以后发展提供方向，也为绩效评价体系打分奠定基础。

3. 分析评价

评价小组在完成资料检查、现场调查后对项目的整体情况进行汇总、分析工作，对本次绩效评价中的重点、难点和疑点问题及时组织相关人员进一步分析讨论，形成较为科学的绩效评价结论。

4. 撰写报告


撰写高台县城关全民健身中心建设项目绩效评价报告，全面、准确反映专项资金使用绩效水平和预期目标实现程度，各项评价数据资料要符合项目实际情况和评价工作要求，做到真实合理，严格杜绝虚报、错报、漏报、瞒报等现象，经专家评审通过后最终提交高台县财政局。

三、综合评价情况及评价结论

根据评价指标体系分析评定，高台县城关全民健身中心建设项目绩效评价综合得分 84.1 分，绩效评价等级为“良”，结果显示：该项目在效益方面基本达到预期效果，在过程、产出方面存在一定差距，相比而言决策和效益指标较好，表明项目的实施对社会产生了不错的积极影响。指标得分情况如下表：

高台县城关全民健身中心建设项目得分汇总表					
一级指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	综合得分
分值	16	19	35	30	100

得分	13	16.1	25	30	84.1
得分率	81.25%	84.74%	71.43%	100.00%	84.10%

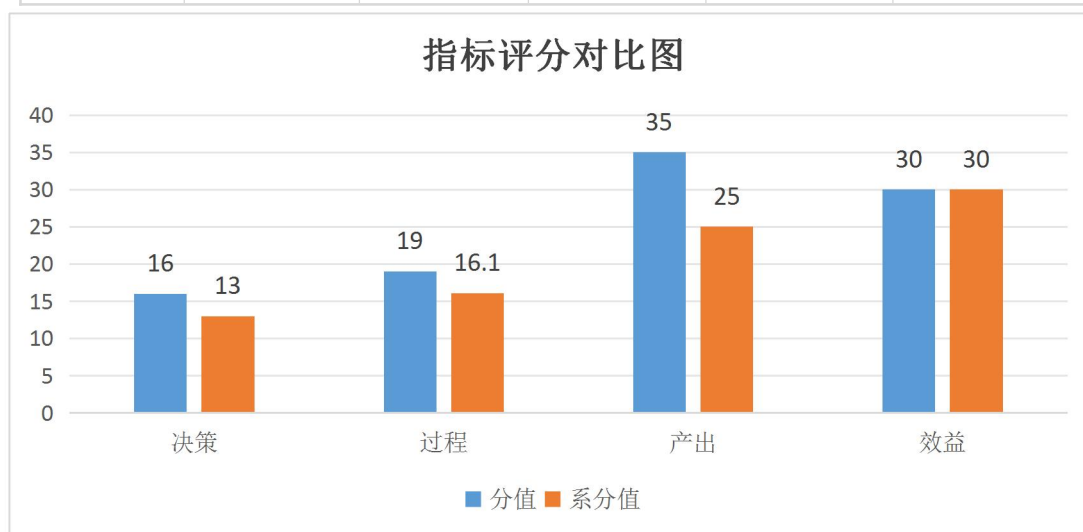

具体评价结果详见附件“绩效评价指标得分表”。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况 (分值 16 分, 得分 13 分)

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	分值	得分	得分率 (%)
决策 (16 分)	项目立项 (6 分)	立项依据充分 (3 分)	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; (1 分) ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; (1 分) ③项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 (1 分)	3	3	100
		立项程序规范性 (3 分)	①项目是否按照规定的程序申请设立; (1 分) ②审批文件、材料是否符合相关要求; (1 分) ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 (1 分)	3	3	100
	绩效目标 (4 分)	绩效目标合理性 (2 分)	①是否有绩效目标; (0.5 分) (若无绩效目标, 与绩效目标相关指标均不得分) ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; (0.5 分) ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; (0.5 分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 (0.5 分)	2	2	100

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	分值	得分	得分率(%)
		绩效指标明确性（2分）	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（0.5分） ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。（0.5分）	2	2	100
	资金投入（6分）	预算编制科学性（4分）	①预算编制是否经过科学论证；（1分） ②预算内容与项目内容是否匹配；（1分） ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；（1分） ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。（1分）	4	1	25
		资金分配合理性（2分）	①预算资金分配依据是否充分；（1分） ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。（1分）	2	2	100
合计				16	13	81.25

1.项目立项（分值6分，得分6分）

（1）立项依据充分性

2016年3月18日，中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要发布，其中第十四篇《提升全民教育和健康水平》第六十章《推进健康中国建设》第七节为《广泛开展全民健身运动》。实施全民健身战略。发展体育事业，加强群众健身活动场地和设施建设，推行公共体育设施免费或低收费开放。根据《甘肃体育发展“十三五”规划》和《张掖市“十三五”体育发展规划》，高台县编制了《高台县体育发展“十三五”规划》，该项目基于国家大的政策，方针，符合高台县体育发展规划，高台县无相关重复项目。本项得3分。

（2）立项程序规范性

①根据《中央基建投资预算管理办法》，为加强和规范中央预算内基建投资项目前期工作经费管理，强化预算约束，提高资金使用效益，建设项目的立项申请、可行性研究、初步设计到项目开工前所进行的一系列工作，主要包括项目建议书、可行性研究报告、初步设计

等工作环节的材料编制、招标、评估、审查、报送及相关工作。政府投资项目实行审批制，对上级部门已下达投资计划的项目，不再审批可行性研究报告，由行业主管部门直接审批初步设计（实施方案）及概算。

②2018年8月，高台县体育运动中心向高台县发展和改革委员会《关于上报高台县城关全民健身中心可行性研究报告》，根据甘肃厚源工程设计有限公司《关于上报〈高台县城关全民健身中心可行性研究报告咨询评估意见〉的报告》（甘厚源评审〔2018〕35号），2018年9月14日，高台县发展和改革委员会下达《关于高台县城关镇全民健身中心可行性研究报告的批复》（高改发〔2018〕162号），同意高台县城关镇全民健身中心建设项目的可行性研究报告。

③2019年10月11日，高台县体育运动中心向高台县发展和改革委员会上报《关于高台县城关全民健身中心建设项目初步设计》和《关于高台县城关全民健身中心建设项目配套设施及变更部分建设内容初步设计的报告》，根据甘肃厚源工程设计有限公司《高台县城关全民健身中心建设项目初步设计审查意见》（甘厚源评审〔2019〕14号）和《高台县城关全民健身中心配套设施及变更部分建设内容初步设计审查意见》（甘厚源评审〔2019〕26号），高台县发展和改革委员会下达《关于高台县城关全民健身中心建设项目初步设计的批复》（高改发〔2019〕146号）和《关于高台县城关全民健身中心建设项目配套设施及变更部分建设内容初步设计的批复》（高改发〔2019〕147号），同意该项目初步设计。

结合以上情况，2019年高台县城关全民健身中心建设项目立项程序符合规定、审批文件符合要求，同时该项目经过了必要的论证、集体决策。本项得3分。

2. 绩效目标（分值4分，得分4分）

（1）绩效目标合理性

高台县城关全民健身中心建设项目绩效目标为完成高台县城关全民健身中心建设项目。该项目绩效目标与实际工作内容相关，预期

产出效益和效果符合正常的业绩水平,本项得 2 分。

(2) 绩效指标明确性

高台县城关全民健身中心建设项目绩效目标均细化分解至三级指标,均为清晰、可衡量、具体的绩效指标,与项目目标任务数相对应。本项得 2 分。

3. 资金投入 (分值 6 分, 得分 3 分)

(1) 预算编制的科学性

依据《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10 号)“项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应”设立司对《高台县城关全民健身中心建设项目预算书》进行了评审,并出此指标。通过项目资料和财务材料核查获取数据,高台县城关全民健身中心建设项目在正式开工前,高台县体育运动中心已编制了《高台县城关全民健身中心建设项目预算书》,后由高台县财政局委托甘肃海科工程咨询有限公司了《高台县城关全民健身中心建设项目评审报告》(甘海科审字〔2019〕第 117 号),2019 年 10 月 29 日,高台县财政局《关于高台县城关全民健身中心建设项目预算评审的批复》(高财绩〔2019〕4 号)。经评审后预算调整量较小,全民健身中心送审预算 8,486,205.7 元,审定金额 7,781,564.2 元,减审额 704,641.5 元,审减率 8.3%,调整幅度不大。施工队核对工程量清单后,认为招标工程量有少算、漏算情况,2020 年 8 月 10 日,高台县社会体育中心委托甘肃省鸿宇建设咨询有限公司重新编制高台县城关全民健身中心建设项目预算并且经过高台县财政厅审定预算造价为 1,148.22 万元,全民健身中心建设项目预算编制经过专家论证,篮球场设计的木地板,招标清单为塑胶地板,导致预算内容与项目内容不匹配,预算测算依据不充分,预算确定的项目投资额与工作任务不匹配。本项得 1 分。

(2) 资金分配合理性

依据《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10 号)“项目预算资金分配是否有测算依据,与项目实际是否相适应”设立此指标。根据甘肃省财政厅《关于下达 2019 年公共体育普及工程中央基

建投资预算（拨款）的通知》（甘财经〔2019〕50号）、2022年8月2日《关于全县财政预算调整方案的决议》（人大常发〔2022〕15号）和项目方案设计，项目资金分配依照项目实际资金需求申请拨付使用，该项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理。本项得2分。

（二）项目过程情况（分值19分，得分16.1分）

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	分值	得分	得分率(%)
过程 (19分)	资金管理 (11分)	资金到位率(4分)	①资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。(1分) ②实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。(1分)	4	3.41	85.25
		预算执行率(3分)	①预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。(2分) ②实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。(2分)	3	2.69	89.67
		资金使用合规性(4分)	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；(1分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；(1分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；(1分) ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(1分)	4	4	100
	组织实施 (8分)	管理制度健全性(4分)	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；(2分) ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。(2分)	4	3	75
		制度执行有效性(4分)	①否遵守相关法律法规和相关管理规定；(1分) ②项目调整及支出调整手续是否完备；(1分) ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；(1分) ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。(1分)	4	3	75
合计				19	16.1	84.74

1.资金管理（分值11分，得分10.1分）

（1）资金到位率

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）“实际到位资金与预算资金的比率”设立此指标。截至评价日，高台县财政局委托甘肃众博工程咨询有限公司评审项目预算，重新审定预算为1,148.22万元，高台县社会体育运动中心实际收到下达预算资金480万元，一般债券资金500万元，资金未全部到位，资金到位率85.35%。本项得3.41分。

（2）预算执行率

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）“实际支出资金与实际到位的比率”设立此指标。截至评价日，高台县社会体育运动中心累计支付项目资金880万元，已到位资金980万元，该项目预算执行率为89.80%。本项得2.69分。

（3）资金使用合规性

高台县城关全民健身中心项目资金使用符合《基本建设财务规则》的规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金的支付有完整的审批程序和手续。本项得4分。

2.组织实施（分值8分，得分6分）

（1）管理制度健全性

高台县体育运动中心2019年制定了《高台县社会体育运动中心财务管理制度汇编》，其中包含财务管理制度、货币资金管理制度、财务票据管理制度、大件品采购制度、固定资产管理制度、合同管理制度、预算管理制度、报销结算工作制度、内部牵制制度、“三重一大”决策制度实施细则、收支管理内部控制制度、预算业务管理办法、基建工程项目建设管理办法，共13项制度。部分内容不符合相关法律规定，如固定资产管理中第十一条，“固定资产局部拆除的，按拆除部分的原值调减”，应按拆除部分的账面价值调减。本项得3分。

（2）制度执行有效性

根据《高台县社体中心基建工程项目建设管理办法》可得知2019年高台县城关全民健身中心建设项目的实施符合相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续都有相关文件可查询，并附有专业咨询机构的技术支持，截止2023年9月20日该项目实施的人员

条件、场地设备、信息支撑等均已落实到位，但该项目虽已竣工验收，但验收报告及技术鉴定等资料还未完成。本项得 3 分。

(三) 项目产出情况 (分值 35 分, 得分 25 分)

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	分值	得分	得分率 (%)
产出 (35 分)	产出数量 (12 分)	全民健身中心计划建设面积计划完成数 (4 分)	①完成全民健身中心建筑占地面积 2917.72 平方米; (2 分) ②完成全民健身中心建设面积 3198.27 平方米。(2 分)	4	4	100
		全民健身中心计划室内配套设施计划完成数(5分)	①完成全民健身中心篮球场地 2 块; (1 分) ②完成全民健身中心羽毛球场地 2 块; (1 分) ③完成全民健身中心排球场地 1 块; (1 分) ④完成全民健身中心健身场馆 1 处; (1 分) ⑤完成全民健身中心乒乓球场馆 1 处。(1 分)	5	5	100
		全民健身中心计划附属设施计划完成数 (3 分)	①完成全民健身中心附属设施停车位 20 辆; (1.5 分) ②完成全民健身中心室外绿化带。(1.5 分)	3	3	100
	产出质量 (13 分)	全民健身中心建设项目验收合格率 (5 分)	工程项目分别完成分部验收、分项验收、专项验收、竣工验收及备案。(5 分)	5	5	100
		全民健身中心工程配套设施质量达标率 (8 分)	①全民健身中心篮球场地地板质量达标率; (2 分) ②全民健身中心场馆地胶质量达标率; (2 分) ③全民健身中心场地器材质量达标率; (2 分) ④全民健身中心场馆建筑质量达标率。(2 分)	8	8	100
	产出时效 (6 分)	工程项目建设开工,完工及时率(4分)	①项目建设按计划时间开工; (2 分) ②项目建设按计划时间竣工。(2 分)	4	0	0
		工程项目建设计划进度完成率 (2 分)	项目建设按照计划进度完成率。(2 分)	2	0	0

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	分值	得分	得分率(%)
	产出成本(4分)	项目建设成本控制率(4分)	①项目建设总投入控制在预算范围内；(2分) ②造价调整幅度控制在10%以内。(2分)	4	0	0
合计				35	25	71.43

1.产出数量(分值12分,得分12分)

(1)全民健身中心计划建设面积计划完成数

截止2023年9月21日,全民健身中心建设项目已完成工程验收,完成建筑面积3198.27平方米,地上一层,局部两层,框架结构。建筑总高度为15.15米,一楼层高6米,二楼层高9米,长度为78.8米,宽度为36.8。本项得4分。

(2)全民健身中心计划室内配套设施计划完成数

通过实地查看,全民健身中心已完成篮球场地2块、羽毛球场地2块、排球场地1块、健身场馆1处、乒乓球场馆1处。本项得5分。

(3)全民健身中心计划附属设施计划完成数

通过实地查看,全民健身中心已完成附属设施停车位20辆、完成室外绿化带。本项得3分。

2.产出质量(分值13分,得分13分)

(1)全民健身中心建设项目验收合格率

截止2023年9月21日,全民健身中心建设项目已完成工程验收,甘肃省房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案表中,建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位、工程质量监督机构均认定该项目符合验收条件,同意该工程为合格工程。本项得5分。

(2)全民健身中心工程配套设施质量达标率

截止2023年9月21日,全民健身中心建设项目已完成工程验收,甘肃省房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案表中,建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位、工程质量监督机构均认定该项目符合验收条件,同意该工程为合格工程,工程配套设施质量均达标。本项得8分。

3.产出时效（分值 6 分，得分 0 分）

（1）工程项目建设开工，完工及时率

根据项目可行性研究报告，拟建工程 2018 年 8 月进行可研论证，9 月初步设计及施工图设计等施工前准备工作。建设期 12 个月，即自 2018 年 10 月开始施工至 2019 年 10 月竣工验收，2019 年 11 月正式交付使用（不可抗力因素除外）。但实际开工日期为 2020 年 3 月 25 日，项目验收日期为 2023 年 10 月 16 日。本项得 0 分。

（2）工程项目建设计划进度完成率

高台县城关全民健身中心建设项目计划于 2018 年 10 月开工，建设期 12 个月，即自 2018 年 10 月开始施工至 2019 年 10 月竣工验收，2019 年 11 月正式交付使用（不可抗力因素除外）。由于建设期间资金到位不及时，项目概算不实等原因，未按计划进行建设。本项得 0 分。

4.产出成本（分值 4 分，得分 0 分）

项目建设成本控制率

截止 2023 年 10 月 20 日，该项目已完成建设，但项目总成本还未核算，项目无评分依据。本项得 0 分。

（四）项目效益情况（分值 30 分，得分 30 分）

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	分值	得分	得分率（%）
效益 (30)	项目效益 (30分)	经济效益 (2分)	提高周边体育产业的发展。（2分）	2	2	100
		社会效益 (8分)	①提高强身健体意识；（2分） ②增加人均健身场地面积；（2分） ③增加体育锻炼人口≥2000人；（2分） ④完善社会体育基础建设。（2分）	8	8	100
		生态效益 (3分)	①可以达到环境要求；（1分） ②采用节能材料及新材料、新设备；（1分） ③未对环境造成污染。（1分）	3	3	100

	可持续影响(8分)	①维护费为财政支出预算；(2分) ②由高台县体育运动中心人员实施管理；(2分) ③是全面提升高台城市形象的重要指标性建筑；(2分) ④壮大全民健身服务体系发展。(2分)	8	8	100
	满意度(9分)	随机调查居民满意度，满意度(非常满意和满意)达95%(含)以上得9分，未达95%，按(满意度百分比-60%)/35%*3分得分，低于60%以下不得分。	9	9	100
合计			30	30	100

1.经济效益(分值2分，得分2分)

高台县城关全民健身中心建设项目是高台县发展第三产业的组成部分，有助于促进高台县周边体育产业的发展。加快体育产业的发展是建立社会主义市场经济体制的需要，符合我国经济结构战略性调整的要求，对于扩大内需、拉动经济增长，实现现代化建设发展目标，有着明显的推动作用。本项得2分。

2.社会效益(分值8分，得分8分)

我国社会主义现代化建设的根本目的是满足广大人民群众日益增长的物质文化需要。经济越发展，社会越进步，人们强身健体的意识就越强烈，体育的地位就越重要，作用就越显著。高台县城关全民健身中心建设项目的建设，完善了社会体育基础建设，增加体育锻炼人口 ≥ 2000 人，增加人均健身场地面积，丰富了居民体育活动内容，有助于提高高台县居民强身健体意识。本项得8分。

3.生态效益(分值3分，得分3分)

高台县城关全民健身中心项目的建设在工程施工期间对环境采取保护措施，为减少施工期的粉尘污染，采用设备具有良好的除尘和密封装置，采用节能材料及新材料、新设备，且污染源排放量也很少，产生的废水和废渣经过处理后，对环境污染较小，可以达到高台县环境要求。本项得3分。

4.可持续性影响(分值8分，得分8分)

高台县城关全民健身中心建成后，日常维护费为财政支出预算，由高台县体育运动中心人员实施管理，高台县城关全民健身中心的建

设，践行了科学发展观，做到以人为本，服务于广大人民群众。为高台县的体育事业创造良好的条件，从而可以更好地促进高台县经济建设和社会发展，充分满足经济社会发展需求，促进高台县的经济建设和社会事业持续、健康的快速发展。本项得 8 分。

5.满意度（分值 9 分，得分 9 分）

关于高台县城关全民健身中心项目居民的满意度，设计发放调查问卷 30 份，收回有效问卷 30 份，收回的问卷调查在体验感方面、个人感受方面、环境方面、总体评价均满意。本项得 9 分。

五、主要经验及做法

制定了基建工程项目建设管理办法

根据《中华人民共和国建筑法》、财政部印发的《基本建设财务管理规定》和张掖市人民政府《关于对扩大内需项目实施实行责任包干制的通知》，结合张掖市体育系统基建工程项目建设管理实际，高台县体育中心制定了基建工程项目建设管理办法，明确了该单位基建工程项目建设管理工作，规范工程项目建设管理程序，明确管理责任、监督机制，有利于保证工程建设质量，控制投资规模和建设成本，充分发挥投资效益。

六、存在的问题

无

七、有关建议

无

(此页无正文)

附件：

- 1、附表 1：绩效评价指标评分表
- 2、甘肃正邦力生会计师事务所营业执照
- 3、主评人执业证书

甘肃正邦力生会计师事务所（普通合伙） 主评人：

中国·兰州

二〇二三年十一月十日

附表1：

绩效评价指标评分表

项目名称：高台县城关全民健身中心建设项目

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	分值	得分	得分率(%)
决策(16分)	项目立项(6分)	立项依据充分(3分)	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；(1分)	1	1	100
			②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；(1分)	1	1	100
			③项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。(1分)	1	1	100
		立项程序规范性(3分)	①项目是否按照规定的程序申请设立；(1分)	1	1	100
			②审批文件、材料是否符合相关要求；(1分)	1	1	100
			③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。(1分)	1	1	100
	绩效目标(4分)	绩效目标合理性(2分)	①是否有绩效目标；(0.5分)(若无绩效目标，与绩效目标相关指标均不得分)	0.5	0.5	100
			②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；(0.5分)	0.5	0.5	100
			③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；(0.5分)	0.5	0.5	100
			④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(0.5分)	0.5	0.5	100
		绩效指标明确性(2分)	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；(1分)	1	1	100
			②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；(0.5分)	0.5	0.5	100
			③是否与项目目标任务数或计划数相对应。(0.5分)	0.5	0.5	100
	资金投入(6分)	预算编制科学性(4分)	①预算编制是否经过科学论证；(1分)	1	1	100
			②预算内容与项目内容是否匹配；(1分)	1	0	0
			③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；(1分)	1	0	0
			④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。(1分)	1	0	0
		资金分配合理性(2分)	①预算资金分配依据是否充分；(1分)	1	1	100
			②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。(1分)	1	1	100
过程(19分)	资金管理(11分)	资金到位率(4分)	①资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。(4分) 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。	4	3.41	85.25
		预算执行率(3分)	①预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。(3分) 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	3	2.69	89.67

附表1：

绩效评价指标评分表

项目名称：高台县城关全民健身中心建设项目

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	分值	得分	得分率(%)
过程 (19分)	资金管理 (11分)	资金使用 合规性 (4分)	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分）	1	1	100
			②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）	1	1	100
			③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）	1	1	100
			④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（1分）	1	1	100
	组织实施 (8分)	管理制度 健全性 (4分)	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（2分）	2	2	100
			②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分）	2	1	50
		制度执行 有效性 (4分)	①否遵守相关法律法规和相关管理规定；（1分）	1	1	100
			②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）	1	1	100
			③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（1分）	1	0	0
			④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（1分）	1	1	100
产出 (35分)	产出数量 (12分)	全民健身中心计划 建设面积 计划完成 数(4分)	①完成全民健身中心建筑占地面积 2917.72 平方米；（2分）	2	2	100
			②完成全民健身中心建设面积 3198.27 平方米。（2分）	2	2	100
		全民健身中心计划 室内配套设施计划 完成数 (5分)	①完成全民健身中心篮球场地 2 块；(1 分)	1	1	100
			②完成全民健身中心羽毛球场地 2 块；(1 分)	1	1	100
			③完成全民健身中心排球场地 1 块；(1 分)	1	1	100
			④完成全民健身中心健身场馆 1 处；(1 分)	1	1	100
			⑤完成全民健身中心乒乓球场馆 1 处。(1 分)	1	1	100
		全民健身中心计划 附属设施 计划完成 数(3分)	①完成全民健身中心附属设施停车位 20 辆；(1.5分)	1.5	1.5	100
			②完成全民健身中心室外绿化带。（1.5 分）	1.5	1.5	100
	产出质量 (13分)	全民健身中心建设 项目验收 合格率 (5分)	工程项目分别完成分部验收、分项验收、专项验收、竣工验收及备案。（5分）	5	5	100
		全民健身中心工程 配套设施 质量达标 率(8分)	①全民健身中心篮球场地板质量达标率；（2分）	2	2	100
			②全民健身中心场馆地胶质量达标率；（2分）	2	2	100
			③全民健身中心场地器材质量达标率；（2分）	2	2	100
			④全民健身中心场馆建筑质量达标率。（2分）	2	2	100

附表1：

绩效评价指标评分表

项目名称：高台县城关全民健身中心建设项目

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	分值	得分	得分率(%)
产出 (35分)	产出时效 (6分)	工程项目 建设开 工，完工 及时率 (4分)	①项目建设按计划时间开工；（2分）	2	0	0
			②项目建设按计划时间竣工。（2分）	2	0	0
		工程项目 建设计划 进度完成 率(2分)	项目建设按照计划进度完成率。（2分）	2	0	0
	产出成本 (4分)	项目建设 成本控制 率(4分)	①项目建设总投入控制在预算范围内；（2分）	2	0	0
			②造价调整幅度控制在 10%以内。（2分）②造价调整幅度控制在 10%以内。（2分）	2	0	0
效益 (30分)	项目效益 (30分)	经济效益 (2分)	提高周边体育产业的发展。（2分）	2	2	100
		社会效益 (8分)	①提高强身健体意识；（2分）	2	2	100
			②增加人均健身场地面积；（2分）	2	2	100
			③丰富了居民体育活动内容；（2分）	2	2	100
			④完善社会体育基础建设。（2分）	2	2	100
		生态效益 (3分)	①可以达到环境要求；（1分）	1	1	100
			②采用节能材料及新材料、新设备；（1分）	1	1	100
			③未对环境造成污染。（1分）	1	1	100
		可持续影响 (8分)	①是高台县体育事业发展的需要；（2分）	2	2	100
			②适应广大人民群众日益增长的体育生活的需要；（2分）	2	2	100
			③是全面提升高台城市形象的重要指标性建筑；（2分）	2	2	100
			④壮大全民健身服务体系发展。（2分）	2	2	100
		满意度 (9分)	随机调查居民满意度，满意度达 95%(含)以上得 10 分，未达 95%，按 (满意度百分比-60%)/35%*3 分得分，低于 60%以下不得分。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	9	9	100
总分				100	84.1	84.1
